



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


CRONOPROGRAMMA

REALIZZAZIONE CAMPI ORMEGGIO



-ISOLE TREMITI-

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	02/03/2015	02/03/2015	0
2	B	Preparazione cantiere	03/03/2015	05/03/2015	2
3	C.1	SURVEY Ispezione siti installazione	06/03/2015	14/03/2015	8
4	C.2	Verifica profondità e posizionamento DGPS	15/03/2015	23/03/2015	8
5	D.1	SISTEMI ANCORAGGIO 8m F3 Isola S. Nicola	24/03/2015	27/03/2015	3
6	D.2	Ancoraggio 8m F3 Isola Cretaccio	28/03/2015	29/03/2015	1
7	D.3	Ancoraggio 15m F3 Isola Cretaccio	30/03/2015	02/04/2015	3
8	D.4	Ancoraggio 8m F3 Isola San Domino	20/04/2015	26/04/2015	6
9	D.5	Ancoraggio 8m F4 Isola San Domino	27/04/2015	28/04/2015	1
10	D.6	Ancoraggio 15m F5 Isola San Domino	29/04/2015	09/05/2015	10
11	D.7	Ancoraggio 24m F5 Isola San Domino	10/05/2015	12/05/2015	2
12	D.7	Ancoraggio 15m F3 Diving	13/05/2015	18/05/2015	5
13	E.1	SISTEMI ORMEGGIO Isola S. Nicola	13/04/2015	16/04/2015	3
14	E.2	SISTEMI ORMEGGIO Isola Cretaccio	17/04/2015	20/04/2015	3
15	E.3	SISTEMI ORMEGGIO Isola San Domino	19/05/2015	27/05/2015	8
16	E.4	SISTEMI ORMEGGIO Diving	28/05/2015	30/05/2015	2
17	F	Fine lavori	30/05/2015	31/05/2015	1

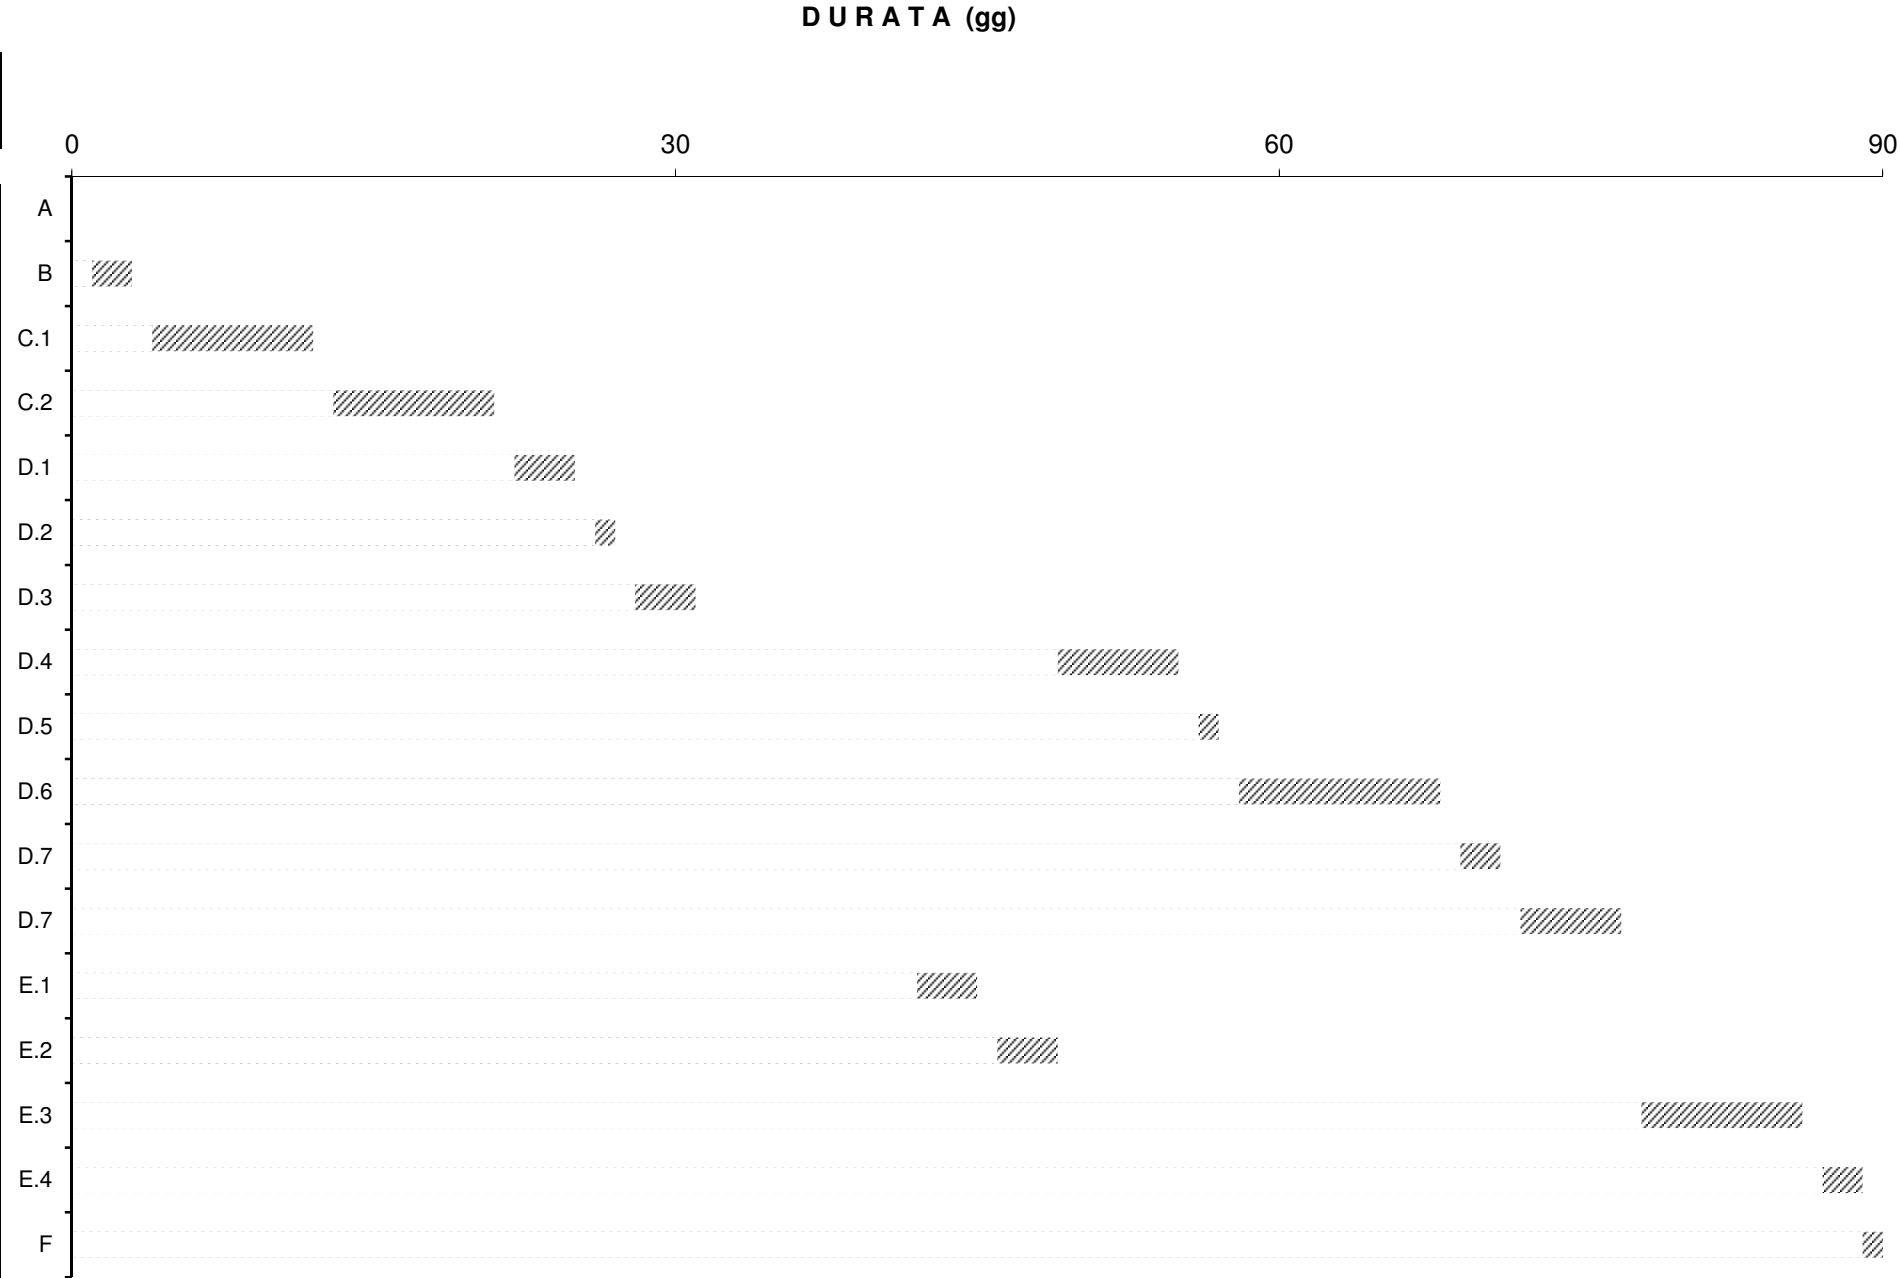

Inizio dei
lavori

0 gg

Fine lavori

90 gg

TC

90

gg.

naturali consecutivi
